

**«АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ З  
УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА  
ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ  
«ПІДРЯДНИК БУДІВНИЦТВА 3.0. УПРАВЛІННЯ  
БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ»**

Єдина інформаційна база управління будівництвом  
«1С:Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним  
виробництвом» дозволяє автоматизувати роботу

## Інженер ВТВ

- Формування календарних планів
- Облік фактичного виконання
- Аналіз виконання планів та прогнозування

## Інженер ВМТЗ

- Облік поставок на об'єкти
- Формування та розміщення заявок на матеріали
- Аналіз забезпеченості матеріалами та обладнанням

## Інженер ВГМ

- Формування планів роботи техніки
- Облік роботи техніки на об'єктах
- Аналіз забезпеченості будівельними машинами та механізмами

ТОВ «ІМПУЛЬС-ІВЦ» створило рішення на базі технологічної платформи «Підприємство 8.3» – «Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом»

Дане галузеве рішення містить наступні підсистеми:

- Управління персоналом
- БМіМ
- Управління закупками
- Управління запасами
- Управління будівельним виробництвом

## УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Управління персоналом

БМіМ

Управління закупівлями

Управління запасами

Управління будівельним виробництвом

Кадровий облік

Управление СМіМ

Планування закупок

Інвентаризація матеріалів

Планування будівництва

Планування та облік виконавців


Планування та облік БМіМ

Облік та аналіз закупок

Складський облік

Облік та аналіз будівництва

## ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

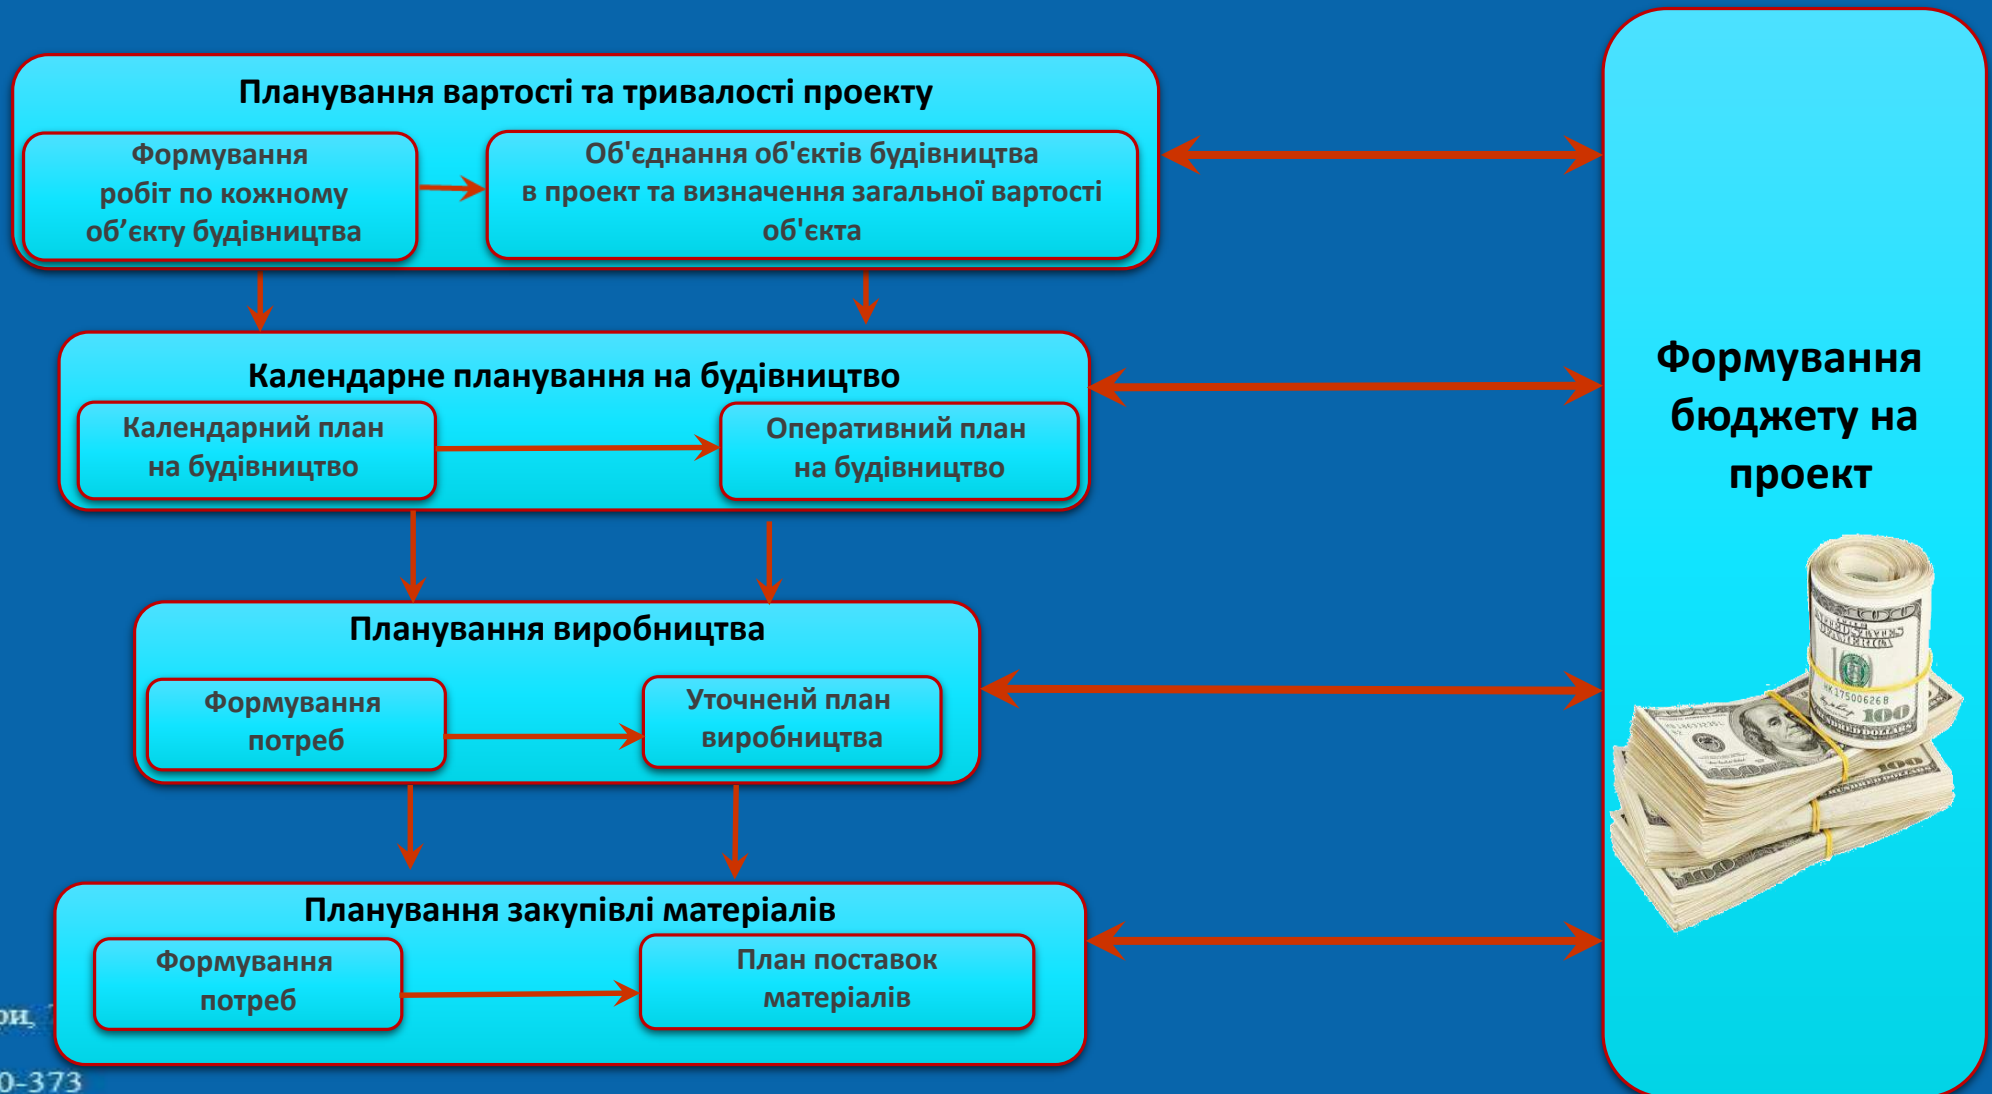

## ІНФОРМАЦІЙНО-МАТЕРІЛЬНІ ПОТОКИ В БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ



## «УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ»

«Подрядник будівництва.3.0. Управління будівельним виробництвом», пропонує наступні можливості:



Управление строительным  
производством

### Підсистема «Управління будівельним виробництвом»:

- Можливість ведення розрахунків календарного планування для портфеля проектів;
- Формування оперативних планів робіт по завершеному календарному плану;
- Формування тижнево-добових графіків робіт за будь який проміжок часу;

Формування завдань на виконання робіт для бригад та підрядних організацій;

Ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану;

Заповнення актів приймання виконаних робіт(форма КБ-2), та довідки про вартість

виконаних робіт (форма КБ- 3)

Ведення обліку витрачених матеріалів в розрізі робіт і об'єктного будівництва, формування

звіту (форма М-29);

Заповнення загального журналу робіт (форма КБ-6) та журналу обліку виконаних робіт (форма КБ-6а);

вул. Володимира Сосюра, 7  
Київ, Україна, 02090  
Телефон: +380 (44) 383-0-373  
Ел. пошта: lesi@impuls-ivc.ua  
Сайт: www.impuls-ivc.ua



**Підсистема «Управління запасами»:**

- Оприбуткування матеріалів по раніше сформованим замовленням;
- Інвентаризація матеріалів з можливістю формування зворотних тар;
- Визначення матеріалів, необхідних для виконання робіт в рамках календарного плану;
- Аналіз витрачання матеріалів по роботах календарного плану і по об'єкту будівництва в цілому;
- Аналіз залишків матеріалів по матеріально-відповідальним особам, по складах і по організаціям;

**Підсистема «БМiМ»:**

- Ведення обліку машин і механізмів;
- Призначення машин і механізмів на роботи календарного плану;
- Фактичний облік застосування машин і механізмів;
- Побудова графіків використання машин і механізмів



Управління  
закупками



БМiМ

## Підсистема «Управління персоналом»:


Ведення кадрового обліку;

Призначення безпосередніх виконавців співробітників для виконання запланованих робіт;

Призначення персональної відповідальності за виконання робіт календарного плану;

Ведення табеля виконавців співробітників, фактично брали участь в роботах;

Побудова графіків руху робочої сили.



## Підсистема «Управління закупівлями»:

Можливість управління закупівлями на підставі потреб;

Формування плану поставок матеріалів по об'єктах будівництва на довільний період часу;

Формування заявок на закупівлю неврахованих потреб і автоматичне формування надходжень по ним;

Аналіз виконаних і прострочених замовлень і їх закриття;

Формування звітів для отримання інформації по номенклатурним позиціям відображених в замовленнях.





# КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

## КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

### Управління будівельним виробництвом

#### Планування:

- проект
- Календарний план будівництва;
- Оперативний план будівництва;
- Призначення виконавців, машин і механізмів на роботи КП;
- Формування потреб,
- План поставок матеріалів..

#### Облік виконання:

- Виконання робіт календарного плану;
- Акт приймання виконаних робіт;
- Акт прихованих робіт;
- Наряд-завдання;
- Реалізація будівельних, робіт і послуг.

#### Контроль і аналіз виконання:

- Звіт про вартість робіт;
- Звіт за календарним планом робіт;
- Попереднє виконання;
- Розрахункова вартість виконання по місяцях;
- Аналіз виконання робіт КП;
- Звіт за даними контрагентів;
- Контроль документів виконання;
- Журнал виконаних робіт.

## ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Довідник «Проекти» призначений для укрупненого уявлення переліку робіт по різних об'єктах будівництва

ТЦ "Европейский" (Проект)

Записать и закрыть ☰ Все действия ▾ ?

Наименование: ТЦ "Европейский" Код: 000000002

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Вид строительства: Производственное и жилищно-гражданское строительство

Валюта: RUB

Стоимость: 75 000 000,00

Объекты строительства | Работы

Дерево объектов строительства: ✎ ✕ + Добавить новую группу работ + Добавить группу работ из списка

	Начало работ	Окончание работ	Объем	Единица измерения
Объекты строительства				
ТЦ "Европейский"				
ТЦ "Европейски...	01.10.2013 9:00:00			
Работы				
Субподрядные рабо...				
Подготовка тер...				
Выравниван...	01.10.2013 9:00:00	09.10.2013 11:00:00	100,000	м2
Гравийная з...	09.10.2013 9:00:00	17.10.2013 11:00:00	100,000	м3
Временные зда...				
Возведение ...	17.10.2013 9:00:00	25.10.2013 11:00:00	100,000	м
Собственные работы				
Временные зда...				
Устройство ...	25.10.2013 9:00:00	05.11.2013 11:00:00	100,000	м
Устройство ...	05.11.2013 9:00:00	13.11.2013 11:00:00	100,000	м

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА

Работы | Взаимосвязи работ | Диаграммы Ганта | Сетевая диаграмма

2013.4  
Октябрь 2013 | Ноябрь  
30 07 14 21 28 04

Календарний план 000000001 від 23.08.2013 18:15:52

Провести за закрыти | Провести | Створити на пастві

Номер: 000000001 | Дата: 23.08.2013 18:15:52

**УТВЕРЖДЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РАБОТ № 00001 от 17 октября 2013 г.  
по объекту строительства "ТЦ "Европейский""  
для варианта "ТЦ "Европейский" (основной)"**

Адрес строительства: г. Москва  
Ответственный:

		Период строительства			
		по договору		рассчитаное по календарному плану	
начало	окончание	длительность	начало	Окончание	длительность
		0 дн.	01.10.2013	05.11.2013	35 дн.

Наименование работы	Код	Объем	Ед. объема	Трудоемкость	Машиноемкость	Дата и время начала	Дата и время окончания	Продолжительность
<b>Возведение забора</b>	<b>000000003</b>							
Установка забора	0000000010	50,000	м			15.10.2013 17:30:00	21.10.2013 9:30:00	2
Устройство фундаментов для стоек	0000000009	50,000	м3			10.10.2013 16:30:00	15.10.2013 17:30:00	2
<b>Выравнивание территории строительства</b>	<b>000000001</b>							
Выравнивание территории бульдозером	0000000006	50,000	м3			01.10.2013 9:00:00	04.10.2013 10:00:00	2
Засыпка ям	0000000007	50,000	м2			02.10.2013 14:30:00	07.10.2013 15:30:00	2
<b>Гравийная засыпка проезжих частей</b>	<b>000000002</b>							
Засыпка гравием проезжей части	0000000008	100,000	м3			07.10.2013 15:30:00	15.10.2013 17:30:00	5
<b>Устройство бытовок</b>	<b>000000004</b>							
Установка на место монтажа бытовок размером 3*3	0000000012	50,000	м			21.10.2013 9:30:00	24.10.2013 10:30:00	2
Устройство основания	0000000011	50,000	м2			15.10.2013 17:30:00	21.10.2013 9:30:00	2
<b>Устройство душевых кабин</b>	<b>000000005</b>							
Установка душевых кабин и подключение водоснабжения	0000000014	50,000	м2			30.10.2013 17:00:00	05.11.2013 18:00:00	2
Устройство основания и проводка канализации	0000000013	50,000	м			24.10.2013 10:30:00	29.10.2013 11:30:00	2

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
Бабаян Мартин Павлович  
расшифровка

## РЕЄСТРАЦІЯ ФАКТУ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

Наряд-задание 000000001 от 12.11.2013 10:53:22 \*

Провести и закрыть



Провести

Создать на основании ▾

Печать ▾

Все действия ▾



Номер:

Период в

Организа

Объект о

Бригада:

+ Доба

N

1

Прораб <u>Смирнов Владимир Игоревич</u>					Объект строительства		Коды
							ТЦ "Европейский"
Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Начало фактич.	Оконч. фактич.	Сумма		
Выравнивание территории бульдозером	м3	50	02.09.2013	31.10.2013 0:00:00	202 150		
Засыпка гравием проезжей части	м3	100	07.10.2013	15.10.2013 0:00:00	568 454		

Прораб <u>Смирнов Владимир Игоревич</u>					Объект строительства		Коды
							ТЦ "Европейский"
Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Начало фактич.	Оконч. фактич.	Сумма		
Выравнивание территории бульдозером	м3	50	02.09.2013	31.10.2013 0:00:00	202 150		
Засыпка гравием проезжей части	м3	100	07.10.2013	15.10.2013 0:00:00	568 454		
					Итого:	770 604	

Бригадир (звеньевой) Смирнов Владимир Игоревич Дата: 22.10.2013

# РЕЄСТРАЦІЯ ФАКТУ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

Выполнение работ календарного плана (создание) \*

Провести и закрыть | Провести | Демонстрация документа | Создать на основании | Печать

Номер: \_\_\_\_\_ от: 28.10.2013 0:00:00 Иерархия работ: \_\_\_\_\_

Начало работ: 01.10.2013 0:00:00 Окончание работ: 05.11.2013 0:00:00

Объект строительства: ТЦ "Европейский"

Утвержденный вариант календарного плана: ТЦ "Европейский" (основной)

Работы: | Дополнительно | Настроить доступ:

Добавить | Заполнить \* | Установить процент выполнения

Работа	Единица измерения	Объем по плану	Выполнено на дат периода процент	Процент объема	Выполнено на кон периода процент
Период			Выполнено на дат периода объем	Объем	Выполнено на кон периода объем
Выравнивание территории бульдозером					
01.10.2013 - 04.10.2013					
Засыпка ям					
02.10.2013 - 07.10.2013					
Засыпка гравием проезжей части					
07.10.2013 - 15.10.2013					
Устройство фундаментов для стоек					
10.10.2013 - 15.10.2013					
Установка бытовок					
10.10.2013 - 21.10.2013					
Устройство душевых кабин					
15.10.2013 - 21.10.2013					

## Выполнение работ № 00000001 от 28 октября 2013

Объект строительства: ТЦ "Европейский"  
 Вариант календарного плана: ТЦ "Европейский" (основной)

Материал	Ед. изм.	Количество по плану	Выполнено по текущей	
			%	Объ
<b>1 Устройство душевых кабин</b>				
1.1 Установка душевых кабин и подключение водоснабжения	м2	50	-100	
<b>2 Устройство бытовок</b>				
2.1 Установка на место монтажа бытовок размером 3*3	м	50	-100	
2.2 Устройство основания	м2	50	-100	
<b>3 Возведение забора</b>				
3.1 Установка забора	м	50	-100	
3.2 Устройство фундаментов для стоек	м3	50	-100	
<b>4 Гравийная засыпка проезжих частей</b>				
4.1 Засыпка гравием проезжей части	м3	100	-100	
<b>5 Выравнивание территории строительства</b>				
5.1 Засыпка ям	м2	50	-100	
5.2 Выравнивание территории бульдозером	м3	50	-100	

вул. Волodymyra Сьомурова, 1  
 Київ, Україна, 02090  
 Телефон: +380 (44) 383-0-373  
 Ел. пошта: lesi@impuls-ivc.ua  
 Сайт: www.impuls-ivc.ua

Утвержденная форма № ИС-2  
 Утверждена постановлением Государственного  
 от 11 ноября 1999г. №100

Инвестор: ООО "Довстар" (перенесено, жорж, пачарак, фамко) Форма по ОКУД: 0322005

Заказчик (субподрядчик): \_\_\_\_\_ По ОКПО: \_\_\_\_\_

Подрядчик (субподрядчик): \_\_\_\_\_ По ОКПО: \_\_\_\_\_

Стройка: г. Москва (перенесено, жорж, пачарак, фамко) По ОКПО: \_\_\_\_\_

Объект: ТЦ "Европейский" (перенесено) По ОКПО: \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП: \_\_\_\_\_

Договор подряда (контракт): ювер

Дата: \_\_\_\_\_

Вид операции: \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
000001	28.10.2013	с 01.10.2013 по 05.11.2013

**АКТ** о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, RUB	Стоимость, RUB
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Выравнивание территории бульдозером		м3	50,000	7 118,00	355 900,00
2		Засыпка ям		м2	50,000	35 234,00	1 761 700,00
3		Засыпка гравием проезжей части		м3	100,000	5 684,54	568 454,00
4		Устройство фундаментов для стоек		м3	50,000		
5		Установка забора		м	50,000		
6		Устройство основания		м2	50,000		
7		Установка на место монтажа бытовок размером 3*3		м	50,000		
8		Устройство основания и проводка канализации		м	50,000		
9		Установка душевых кабин и подключение водоснабжения		м2	50,000		
Итого:					х	х	2 686 054,00
ндс:					х	х	483 489,72
Всего:					х	х	3 169 543,72

Сдал: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

И.п. \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

И.п. \_\_\_\_\_

# КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ФАКТУ ВИКОНАННЯ

Отчет о стоимости работ

Сформировать

Дата начала: 01.02.2013 0:00:00    Объект: ТЦ "Европейский"

Отчет по календарному плану работ

Вариант отчета: Основной

Сформировать    Настройка...

- Вариант календарного плана
- Параметры: Вариант календарного плана
- Работа
- Выравнивание территории бульдозером
  - Засыпка ям
  - Засыпка гравием проезжей части
  - Устройство фундаментов для стоек
  - Установка забора
  - Устройство основания
  - Установка на место монтажа бытовок размером 3\*3
  - Устройство основания и проводка канализации
  - Установка душевых кабин и подключение водоснабжения

Расчетная стоимость работ по месяцам

Вариант отчета: Основной    Выбрать вариант...

Сформировать    Настройка...    Показывать заголовок    Все действия ?

<input checked="" type="checkbox"/>	Дата начала	02.10.2013 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	Дата окончания	31.12.2013 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	Вариант календарного плана	ТЦ "Европейский" (основной)
<input checked="" type="checkbox"/>	Периодичность	День

Параметры: Дата начала: 02.10.2013 0:00:00  
 Дата окончания: 31.12.2013 0:00:00  
 Вариант календарного плана: ТЦ "Европейский" (основной)  
 Периодичность: День

Работа	Стоимость работы	Продолжительность	2 октября 2013 г. Стоимость период	3 октября 2013 г. Стоимость период	4 октября 2013 г. Стоимость период
Выравнивание территории бульдозером	208 400,00	25,00	66 688,00	66 688,00	
Засыпка гравием проезжей части	568 454,00	50,00			
Засыпка ям	1 774 200,00	25,00		567 744,00	567 744,00
Установка душевых кабин и подключение водоснабжения	16 030 000,00	25,00			
Установка забора	503 750,00	25,00			
Установка на место монтажа бытовок размером 3*3	1 506 250,00	25,00			
Устройство фундаментов для стоек	3 043 000,00	25,00			
Устройство основания	34 450,00	25,00			
Устройство основания и проводка канализации	335 750,00	25,00			
<b>Итого</b>			<b>66 688,00</b>	<b>634 432,00</b>	<b>567 744,00</b>

вул. Володимирська  
 Київ, Україна  
 Телефон: +380 44 450 10 10  
 Ел. пошта: ivc@impuls.com.ua  
 Сайт: www.impuls.com.ua

Засыпка гравием

Затраты труда работ

Эксплуатация машин

Материалы

Материал № 2

Материал № 4

Выполнение субподря...

## Контроль документов выполнения

Вариант отчета: Основной

**Сформировать** Настройка...

- Дата начала
- Дата окончания
- Объект строительства
- Периодичность

Параметры: Дата начала: 01.  
Дата окончания:  
Объект строите.  
Периодичность:

Интервал

Дата начала интервала

Работа

01.10.2013  
Выравнивание территории бульв

01.10.2013  
Засыпка ям

01.10.2013  
Установка забора

01.10.2013  
Засыпка гравием проезжей част

01.10.2013  
Устройство фундаментов для ст

01.10.2013  
Устройство основания

01.10.2013  
Устройство основания и проводка канализации

01.10.2013  
Установка забора

01.10.2013  
Устройство основания

## Журнал выполненных работ

Вариант отчета: Основной без титула

Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка...

Все действия ?

Стройка	ТЦ "Европейский"
<input checked="" type="checkbox"/> Начало периода	Начало этого года
<input checked="" type="checkbox"/> Конец периода	30.11.2014 0:00:00
Основной вариант КП	ТЦ "Европейский" (основной)

## Журнал учета выполненных работ

Работа	Единица измерения	Цена единицы	Стоимость работы	Декабрь.2013		Итого	
				Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Выравнивание территории бульдозером	м3	4 168,00	208 400,00	50,000	208 400,00	50,000	208 400,00
Засыпка гравием проезжей части	м3	5 684,54	568 454,00	100,000	568 454,00	100,000	568 454,00
Засыпка ям	м2	35 484,00	1 774 200,00	50,000	1 774 200,00	50,000	1 774 200,00
Установка душевых кабин и подключение водоснабжения	м2	320 600,00	16 030 000,00	50,000	16 030 000,00	50,000	16 030 000,00
Установка забора	м	10 075,00	503 750,00	50,000	503 750,00	50,000	503 750,00
Установка на место монтажа бытовок размером 3*3	м	30 125,00	1 506 250,00	50,000	1 506 250,00	50,000	1 506 250,00
Устройство фундаментов для стоек	м3	60 860,00	3 043 000,00	50,000	3 043 000,00	50,000	3 043 000,00
Устройство основания	м2	689,00	34 450,00	50,000	34 450,00	50,000	34 450,00
Устройство основания и проводка канализации	м	6 715,00	335 750,00	50,000	335 750,00	50,000	335 750,00
<b>Итого</b>				<b>500,000</b>	<b>24 004 254,00</b>	<b>500,000</b>	<b>24 004 254,00</b>



# РЕЕСТРАЦИЯ ФАКТУ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

**АКТ  
освидетельствования скрытых работ**

г.Москва 28.10.2013

Установка душевых кабин и подключение водоснабжения, Устройство основания и проводка канализации, Установка на место монтажа бытовок размером 3\*3, Устройство основания, Установка забора, Устройство фундаментов для стоек, Засыпка гравием проезжей части, Засыпка ям, Выравнивание территории бульдозером  
(наименование работ)

выполненных в ТЦ "Европейский"  
(наименование здания, сооружения)

по адресу г. Москва  
(район застройки, квартал, улица, N дома и корпуса)

Комиссия в составе  
представителей: Авторского надзора \_\_\_\_\_ (при его участии)  
(Указать должность, Технического надзора заказчика \_\_\_\_\_  
Ф. И. О., организация) Генеральной подрядной организации \_\_\_\_\_  
Субподрядной организации \_\_\_\_\_

произвела осмотр работ, выполненных \_\_\_\_\_  
(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы Установка душевых кабин и подключение водоснабжения, Устройство основания и проводка канализации, Установка на \_\_\_\_\_  
(наименование скрытых работ)  
стоек, Засыпка гравием проезжей части, Засыпка ям, Выравнивание территории бульдозером

2. Работы выполнены по проекту \_\_\_\_\_  
(проект серии, наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены Материал №1, Материал № 2, Материал № 3, Материал \_\_\_\_\_  
(наименование материалов, конструкций, № 4, Материал № 4, Материал № 2, Материал № 3, Материал № 2, Материал № 3, Материал №1, \_\_\_\_\_  
изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)  
Материал № 4, Материал № 3, Материал № 4, Материал № 3

4. Дата начала работ \_\_\_\_\_

5. Дата окончания работ \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ**

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.  
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

## Акт скрытых работ (создание) \*

**Провести и закрыть** Провести | Печать ▾ Все действия ▾ ?

Номер:  от: 28.10.2013 0:00:00

Организация:

Объект строительства:

Вариант календарного плана:

Основная | Дополнительно | Настройки доступа

Добавить Подбор | Заполнить Все действия ▾

N	Работа
1	Выравнивание территории бульдозером
2	Засыпка ям
3	Засыпка гравием проезжей части
4	Устройство фундаментов для стоек
5	Установка забора
6	Устройство основания
7	Установка на место монтажа бытовок размером 3*3
8	Устройство основания и проводка канализации
9	Установка душевых кабин и подключение водоснабжения

Ответственный:

Комментарий:

# УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТА ЗАПАСАМИ

## УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ

Можливість формування потреби в ТМЦ на будь-який період часу по кожному підрозділу

Формирование потребностей 000000001 от 18.10.2013 10:07:33

Провести и закрыть

Провести

Движения документа

Все действия

Номер: 000000001 от: 18.10.2013 10:07:33

Заказ поставщику 0000000002 от 01.01.2018 0:00:08

Провести и закрыть

Провести

Движения документа

Создать на основании

Печать

Все действия

Номер: 000000001

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Контрагент: ТОВ "ДЛ"

Вид движения: Заказ на

Корректировка заказа поставщику 000000001 от 17.09.2013 16:44:43 \*

Провести и закрыть

Провести

Движения документа

Все действия

Номер: 000000001 от: 17.09.2013 16:44:43

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Контрагент: ПИ-11

Объект строительства: ТЦ "Ленинский"

Основание: Заказ поставщику 000000003 от 17.09.2013 16:40:54

Материалы

Настройки доступа

Добавить

Удалить

Восстановить

Сортировка

Подбор

Все действия

N	Номенклатура	Ед. изм.	Коэффициент	Количество до коррект	Количество	Цена	Сумма
1	Вода	м2	1,000				
2	Песок	м3	1,000	1,000	150,00	150,00	150,00
3	Цемент	м3	1,000	1,000	112,00	112,00	112,00
4	Щебень	м3	1,000	-1,000	112,00	112,00	-112,00
				1,000	420,00	420,00	420,00
				1,000	420,00	420,00	420,00

Указывается с отрицательным знаком, если нужно исключить из документа материал.

Исправляемый документ: Заказ поставщику 000000003 от 17.09.2013 16:40:54

Ответственный: Мартин

Комментарий:

## УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКАМИ

Можливість оперативного отримання звітів про виконані і прострочені замовлення

### Заказы поставщикам

Вариант отчета:  Выбрать вариант...

▶ Сформировать Настройка... Все действия ▼ ?

---

### Ведомость заказов поставщикам

Вариант отчета:  Выбрать вариант...

▶ Сформировать Настройка... Все действия ▼ ?

<input checked="" type="checkbox"/>	Начало периода			02.10.2013 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	Конец периода			15.11.2013 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	Организация	Равно		ИМПУЛЬС-ИВЦ
<input checked="" type="checkbox"/>	Объект строительства	Равно		ТЦ "Европейский"
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент	Равно		ОАО "ЭгоПласт"

### Ведомость заказов поставщикам

Параметры: Начало периода: 02.10.2013 0:00:00  
Конец периода: 15.11.2013 0:00:00

Отбор: Организация Равно "ИМПУЛЬС-ИВЦ" И  
Объект строительства Равно "ТЦ "Европейский"" И  
Контрагент Равно "ОАО "ЭгоПласт"" И  
Ответственный Равно "Никита Емшанов"

Контрагент				Количество		
Объект строительства				Заявлено	Поставлено	Остаток
№ п/п	Заказ поставщику	Номенклатура	Единица измерения			выполнения
ОАО "ЭгоПласт"				4 750,000	3 548,000	1 202,000
ТЦ "Европейский"				4 750,000	3 548,000	1 202,000
1	Заказ постав щку 00000001 от 08.11.2013 13:46:47	Материал № 2	м	1 500,000	1 000,000	500,000
2	Заказ постав щку 00000001 от 08.11.2013 13:46:47	Материал № 3	м2	2 000,000	1 500,000	500,000
3	Заказ постав щку 00000001 от 08.11.2013 13:46:47	Материал № 4	м3	1 150,000	1 000,000	150,000
4	Заказ постав щку 00000001 от 08.11.2013 13:46:47	Материал №1	кг	100,000	48,000	52,000
<b>Итого</b>				<b>4 750,000</b>	<b>3 548,000</b>	<b>1 202,000</b>

Количество			
Заявлено	Поставлено	Остаток	Выполнено
12,000	12,000		
50,000	50,000		
50,000	50,000		
50,000	50,000		
<b>162,000</b>	<b>162,000</b>		

# УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

# ИМПУЛЬС-ИВЦ

Оформлення прибуткових документів в місцях зберігання і витратних ордерів на матеріали.

Инвентаризация материалов 000000001 от 25.10.2013 11:44:29

Записать и закрыть

Движения документа

Создать на основании

Печать

Видно документа:

«Надходження матеріалів»

гвия

?

Поступление материалов 00000000002 от 25.10.2013 12:15:23

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № 00000000002

ИМПУЛЬС-ИВЦ, ИНН 8965896523, Москва, 2-ая улица Энтузиастов, дом № 5, корпус 3, тел.: 8  
Организация (495) 974-77-05

Структурное подразделение

Форма по ОКУД

0315003

по ОКПО

Все действия

Все действия

Дата составления	Код вида операции	Склад	Поставщик	
			наименование	
25.10.2013		Склад №1	ИнвестСтрой	

Расходный ордер на материалы № 000000002 от 31.10.2013 19:20:55

Поставщик:

ИнвестСтрой

Покупатель:

ИМПУЛЬС-ИВЦ

наименование, сорт, размер, марка	номенклатурный номер	Единица измерения		Количество	
		код	наименование	по документу	принято
1	2	3	4	5	6
Материал № 2	0000000000	006	м		50,000
Материал №1	0000000000	166	кг		50,000
Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0000000000	006	м		12,000
Материал № 3	0000000000	055	м2		50,000
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	0000000000	166	кг		151,000
Итого					313,000

Материал	Количество	Ед. изм	Цена	Сумма
Материал №1	50,000	кг	3 685,00	184 250,00
Материал № 2	50,000	м	358,00	17 900,00
Материал № 3	50,000	м2	35 234,00	1 761 700,00
Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	12,000	м	150,00	1 800,00
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	151,000	кг	120,00	18 120,00
<b>ВСЕГО:</b>				<b>1 983 770,00</b>

Сумма прописью: Один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят рублей 00 копеек

Отпустил: \_\_\_\_\_

Получил: \_\_\_\_\_

Принял

должность

подпись

Сдал

должность

подпись

расшифровка подписи

### Резервирование материалов (создание) \*

Провести и закрыть

Номер:

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Склад: Склад №1

Распределять по работам:  Автоматически

Материалы

Добавить

Материал/Работа
Материалы
Материал №1
Выравнивание территории бу...
Устройство основания
Материал №2
Материал №3
Засыпка ям
Устройство фундаментов для...
Установка забора
Установка на место монтажа...
Установка душевых кабин и п...
Материал №4

Комментарий:

### Списание материалов (создание) \*

Провести и закрыть

Номер:  от: 05.11.2013 0:00:00

Склад: Склад №1

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

МОЛ: Бабаян Мартин Павлович

Объект строительства: ТЦ "Европейский"

Документ основание: Инвентаризация материалов 0000000

Материалы

Настройки доступа

Заполнить

По акту КС-2

По основанию

N	Номенклатура	Количество	Единица измерения	Коэффициент	Ц
1	Материал №1	50,000	кг	1,000	
2	Материал №2	50,000	м	1,000	
3	Материал №3	50,000	м2	1,000	
4	Материал №4	50,000	м3	1,000	
5	Материал №4	200,000	м3	1,000	
6	Материал №2	200,000	м	1,000	
7	Материал №3	150,000	м2	1,000	
8	Материал №2	1 750,000	м	1,000	
9	Материал №3	50,000	м2	1,000	
10	Материал №1	50,000	кг	1,000	
11	Материал №4	150,000	м3	1,000	

Сумма документа: 0,00

Ответственный: Мартин

Комментарий:

## УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

### Остатки материалов на складах

### Ведомость по материалам на складах

#### Анализ потребностей в материалах

Вариант отчета: Основной

**Сформировать** Настройка

- Начало периода
- Конец периода
- Организация
- Объект строительства
- Подразделение

Параметры: Начало периода  
Конец периода

Отбор: Организация Равно

Номенклатура, Базовая единица измерения	Зак. Кол. потре
Материал № 4, м3	
Материал № 2, м	
Материал №1, кг	
Материал № 3, м2	
Итого	

#### Карточка движения материалов

Вариант отчета: Основной

**Сформировать** Настройка...

<input checked="" type="checkbox"/> Начало периода	Начало этого года		
<input checked="" type="checkbox"/> Конец периода	Начало следующего года		
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	Равно	ИМПУЛЬС-ИВЦ	
<input type="checkbox"/> Склад	Равно		
<input type="checkbox"/> Ответственный	Равно		

#### Карточка движения материалов

Параметры: Начало периода: 01.01.2013 0:00:00

Конец периода: 01.01.2014 0:00:00

Отбор: Организация Равно "ИМПУЛЬС-ИВЦ"

Регистратор	Номенклатура, Единица хранения остатков	Цена	Приход		Расход
			Количество	Стоимость	
			Приход	Приход	Количество
					Расход
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 4, м3	154,00	1 000,000	172 500,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 4, м3	441,00	1 000,000	172 500,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал №1, кг	3 685,00	48,000	368 500,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал №1, кг	150,00	48,000	368 500,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 2, м	358,00	1 000,000	716 000,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 2, м	150,00	1 000,000	716 000,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 2, м	450,00	1 000,000	716 000,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 3, м2	35 234,00	1 500,000	70 468 000,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 3, м2	15 020,00	1 500,000	70 468 000,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 3, м2	10 000,00	1 500,000	70 468 000,00	
Поступление материалов 00000000001 от 08.11.2013 14:08:56	Материал № 3, м2	10 000,00	1 500,000	70 468 000,00	

ИМПУЛЬС • ИВЦ

# УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА БМІМ

вул. Володимира Сосюри, 7  
Київ, Україна, 02090  
Телефон: +380 (44) 383-0-373  
Ел. пошта: [lesi@impuls-ivc.ua](mailto:lesi@impuls-ivc.ua)  
Сайт: [www.impuls-ivc.ua](http://www.impuls-ivc.ua)



## УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

При формуванні документу «Приєм на роботу в організацію» здійснюється перевірка вакантних посад по підрозділам організації.

Штатное расписание сотрудников организации 000000001 от 02.09.2013 0:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать

Номер: 00000001 | Дата: 02.09.2013 0:00:00

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Ответственный: Никита Емшанов

N	Структурное подразделение	Должность (специа...
	Наименование	Код
1	Производственный участок №1	000000001
2	Производственный участок №1	000000001
3	Производственный участок №2	000000002
4	Производственный участок №1	000000001
5	Производственный участок №1	000000001
6	Производственный участок №2	000000002
7	Производственный участок №1	000000001
8	Производственный участок №1	000000001
9	Производственный участок №1	000000001
10	Производственный участок №1	000000001
11	Производственный участок №1	000000001

Прием на работу в организацию 00000000001 от 02.09.2013 0:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: 00000000001 | Дата: 02.09.2013 0:00:00

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Вид занятости: Основное место работы

Работники | Настройки доступа

N	Работник	Дата приема	Табельный номер	Подразделение	Должность	Квалификация	Оклад	Количество ставок
1	Владимир Качан	02.09.2013	1	Производственный участок №1	Бригадир	без квалификации	60 000,00	1
2	Евгений Антропов	02.09.2013	2	Производственный участок №1	Начальник ПТО	без квалификации	100 000,00	1
3	Леонид Бичевин	02.09.2013	3	Производственный участок №1	Бригадир	без квалификации	60 000,00	1
4	Никита Ефремов	02.09.2013	4	Производственный участок №1	Сметчик	без разряда	70 000,00	1
5	Алексей Воробьев	02.09.2013	5	Производственный участок №1	Рабочий монтажник сред...	Рабочий монтажник сред...	30 000,00	1
6	Алена Бондарчук	02.09.2013	6	Производственный участок №1	Рабочий каменщик сред...	Рабочий каменщик сред...	45 000,00	1
7	Борис Клюев	02.09.2013	7	Производственный участок №1	Рабочий строитель средн...	Рабочий строитель средн...	30 000,00	1
8	Георгий Тараторкин	02.09.2013	8	Производственный участок №1	Разнорабочий	без квалификации	30 000,00	1
9	Дмитрий Дьяконов	02.09.2013	9	Производственный участок №1	Рабочий сварщик средн...	Рабочий сварщик средн...	45 000,00	1

Комментарий:

Ответственный: Никита Емшанов

Вікно документау:  
«Приєм на роботу в організацію»

## Учет СМІМ 00000001 от 06.11.2013 19:29:35

Провести и закрыть   Провести

Номер: 00000001

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Ответственный: Никита Емшанов

Основная **Настройки доступа**

 Добавить    

N	Структурное подразделение		Наименование
	Наименование	Код	
1	Производственный уч...	000000001	Авто
2	Производственный уч...	000000001	Авто
3	Производственный уч...	000000001	Кран
4	Производственный уч...	000000001	Кран
5	Производственный уч...	000000001	Уста
6	Производственный уч...	000000001	Уста

Комментарий:

## Прием в эксплуатацию машины 00000002 от 02.09.2013 0:00:00

Провести и закрыть   Провести Печать

Все действия 


Номер: 00000002

от: 02.09.2013 0:00:00

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Ответственный: Никита Емшанов

Машины **Настройки доступа**

 Добавить    

Все действия 

N	Машина	Подразделение организации	Дата приема	Регистрационный номер	Гаражный номер
1	Автомобили бортовые, грузопод...	Производственный участок №1	02.09.2013	1	1
2	Автомобили бортовые, грузопод...	Производственный участок №1	02.09.2013	2	2
3	Автомобили бортовые, грузопод...	Производственный участок №1	02.09.2013	3	3
4	Автомобили бортовые, грузопод...	Производственный участок №1	02.09.2013	4	4
5	Краны башенные при работе на ...	Производственный участок №1	02.09.2013	5	5
6	Краны башенные при работе на ...	Производственный участок №1	02.09.2013	6	6
7	Краны на автомобильном ходу п...	Производственный участок №1	02.09.2013	7	7
8	Краны на автомобильном ходу п...	Производственный участок №1	02.09.2013	8	8
9	Установки для гидравлических и...	Производственный участок №1	02.09.2013	9	9
10	Установки для гидравлических и...	Производственный участок №1	02.09.2013	10	10
11	Установки для сварки ручной ду...	Производственный участок №1	02.09.2013	11	11
12	Установки для сварки ручной ду...	Производственный участок №1	02.09.2013	12	12

Комментарий:

## УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

РИВЦ	Форма по ОКУД по ОКПО	Код				
<b>ПРИКАЗ (распоряжение) о переводе работника на другую работу</b>						
<table border="1"> <tr> <th>Номер документа</th> <th>Дата составления</th> </tr> <tr> <td>00000001</td> <td>04.10.2013</td> </tr> </table>		Номер документа	Дата составления	00000001	04.10.2013	
Номер документа	Дата составления					
00000001	04.10.2013					
<table border="1"> <tr> <th>Дата</th> </tr> <tr> <td>с 07.10.2013</td> </tr> <tr> <td>по</td> </tr> </table>		Дата	с 07.10.2013	по		
Дата						
с 07.10.2013						
по						
<table border="1"> <tr> <th>Табельный номер</th> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table>		Табельный номер	1			
Табельный номер						
1						
<p>Веккер Эдуард Витальевич <small>Фамилия, имя, отчество</small></p> <p>постоянно <small>вид перевода (постоянно, временно)</small></p> <p>Проживает по адресу: _____</p>						
Проживает по адресу:	<p>Производственный участок №1 <small>структурное подразделение</small></p> <p>Архитектор <small>должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация</small></p>					
Новое место работы:	<p>Производственный участок №2 <small>структурное подразделение</small></p> <p>Инженер-технолог <small>должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация</small></p> <p>тарифная ставка (оклад) _____ руб. _____ коп. <small>цифрами</small></p> <p>надбавка _____ руб. _____ коп. <small>цифрами</small></p>					
Основание:	<p>Изменение к трудовому договору или другой документ № _____</p> <p>_____ документ (заявление, медицинское заключение и пр.)</p>					
Руководитель организации	<p>_____ должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи</p>					
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен	<p>_____ личная подпись " " _____ 20 г.</p>					

Сообщения

- В строке номер "3" табл. части "Работники": работник и приказ о приеме не соответствуют друг другу!
- В строке номер "3" табл. части "Работники": на 7 октября 2013 г. работник Смирнов Владимир Владимирович еще не принят на работу!

13:14:16:56"1

участ... Инжн

РИВЦ	Форма по ОКУД по ОКПО	Код				
<b>ПРИКАЗ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)</b>						
<table border="1"> <tr> <th>Номер документа</th> <th>Дата составления</th> </tr> <tr> <td>0000000001</td> <td>04.10.2013</td> </tr> </table>		Номер документа	Дата составления	0000000001	04.10.2013	
Номер документа	Дата составления					
0000000001	04.10.2013					
<p>Прекратить действие трудового договора от _____ № _____</p> <p>уволить 7 октября 2013 г. <small>(ненужное зачеркнуть)</small></p>						
<p>Дудина Светлана Петровна <small>Фамилия, имя, отчество</small></p> <p>Производственный участок №1 <small>структурное подразделение</small></p> <p>Ведущий экономист <small>должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация</small></p>		<table border="1"> <tr> <th>Табельный номер</th> </tr> <tr> <td>2</td> </tr> </table>	Табельный номер	2		
Табельный номер						
2						
<p>ст 13 <small>основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)</small></p>						
<p>Основание (документ, номер, дата): _____ заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.</p>						
<p>Руководитель организации _____ должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи</p>						
<p>С приказом (распоряжением) работник ознакомлен _____ личная подпись " " _____ 20 года</p>						
<p>Мотивированное мнение выборного профсоюзного органа в письменной форме (от " " _____ 20 года № _____) рассмотрено</p>						

## ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦВ, МАШИН І МЕХАНІЗМІВ НА РОБОТИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ

Провести и закрыть

Номер: 0000001

Период назначения на работу исполнителей с: 07.10.2013 15:30:00 по: 15.10.2013 17:30:00

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Объект строительства: ТЦ "Европейский"

Работа: Выравнивание территории бульдозером

Исполнители

Добавить

Дата / Смена / Вид ресурса / Ресурс	Время работы / Исполнитель
07.10.2013	
08.10.2013	
09.10.2013	
10.10.2013	
11.10.2013	
12.10.2013	
13.10.2013	
14.10.2013	
15.10.2013	

Задание: Перезаполнить по работе: Быстрый ввод

### Табель исполнителей работ календарного плана (создание)

Провести и закрыть

Номер:  от: 05.11.2013 0:00:00 Период работы с: 01.10.2013 9:00:00 по: 04.10.2013 10:00:00

Период назначения на работу исполнителей с: 01.10.2013 0:00:00 по: 04.10.2013 0:00:00

Организация: ИМПУЛЬС-ИВЦ

Объект строительства: ТЦ "Европейский"

Работа: Выравнивание территории бульдозером

Исполнители

Добавить

Заполнить

С указанием исполнителей

Без исполнителей

Дата / Смена / Вид ресурса / Ресурс	Время работы / Исполнитель
1 октября 2013 г.	
Рабочий день	9:00:00 - 13:00:00
Люди	
Рабочий строитель среднего разряда 2 (Рабочий строитель среднего разряда 2)	Тигов Игорь Витальевич
Рабочий строитель среднего разряда 4 (Рабочий строитель среднего разряда 4)	Смирнов Владимир Игоревич
Машины и механизмы	
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т
2 октября 2013 г.	
Рабочий день	9:00:00 - 13:00:00
Люди	
Рабочий строитель среднего разряда 2 (Рабочий строитель среднего разряда 2)	Тигов Игорь Витальевич
Рабочий строитель среднего разряда 4 (Рабочий строитель среднего разряда 4)	Смирнов Владимир Игоревич
Машины и механизмы	
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т
3 октября 2013 г.	
Рабочий день	9:00:00 - 13:00:00
Люди	

Ответственный: Мартин

Комментарий:

## *РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ:*

- ✓ Створення системи прозорого календарного планування виконання будівельно-монтажних робіт та забезпечення матеріалами та механізмами як в офісі, так і на об'єктах будівництва
- ✓ Оперативне отримання повної інформації про хід використання і забезпечення ресурсами, прийняття своєчасних рішень щодо коригування ситуації
- ✓ Підвищення ефективності роботи виробничих відділів (ВТВ, ВМТЗ, ВГМ) шляхом організації роботи в єдиній інформаційній базі, оптимізація використання робочого часу співробітників

**З питань співпраці та інформаційно-технічної підтримки просимо звертатися за наступними координатами:**

**Розробник:  
ТОВ «ІМПУЛЬС-ІВЦ»,  
Україна, м. Київ  
тел. : (044) 383-0-373,  
e-mail: [lesi@impuls-ivc.ua](mailto:lesi@impuls-ivc.ua),  
[www.impuls-ivc.ua](http://www.impuls-ivc.ua)**

**ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!**
